Universidad Autónoma de Guadalajara

MATERIA:

Administración de proyectos de software

DOCENTE:

Mtro. Manuel Balderas Victoria

CARRERA:

Ingeniería en Software Y Minería de Datos

SEMESTRE: 8º

ACTIVIDAD:

Configuración y control del proyecto

EQUIPO:

César Jesús Alonso Rodríguez

Emmanuel Contreras Ascencio

Hannya Patricia Contreras Solís

Humberto Jireh Castro Martínez

Natalya Ramírez Carrera

FECHA:

22/02/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara

Informe de Estrategia y Control de Proyecto

Proyecto: TaskFlow - Sistema de Gestión de Tareas Académicas.

Metodología Seleccionada: Ágil - Scrum.

Herramienta de Gestión: Jira Software (Cloud).

Enlace de Acceso:

https://edu-team-taskflow.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiMWNjZTA0OWYxZWNlNDE2NjhmOGQxY2RkZDcxNGMzN2IiLCJwIjoiaiJ9

Configuración de la Herramienta y Equipo de Trabajo

Se realizó el alta del proyecto "TaskFlow – Sistema de Gestión de Tareas Académicas" en la plataforma Jira Software, bajo un marco de trabajo Scrum. Para garantizar la colaboración operativa, se configuró el acceso para los cinco integrantes del equipo, asignando los permisos correspondientes según los roles definidos en el Project Charter:

- Hannya Patricia Contreras Solís: Product Owner y QA.
- César Jesús Alonso Rodríguez: Backend Developer y responsable de lógica de servidor.
- Emmanuel Contreras Ascencio: Database Administrator (DBA).
- Humberto Jireh Castro Martínez: Documentación Técnica y artefactos.
- Natalya Ramírez Carrera: Frontend Developer y UI/UX.

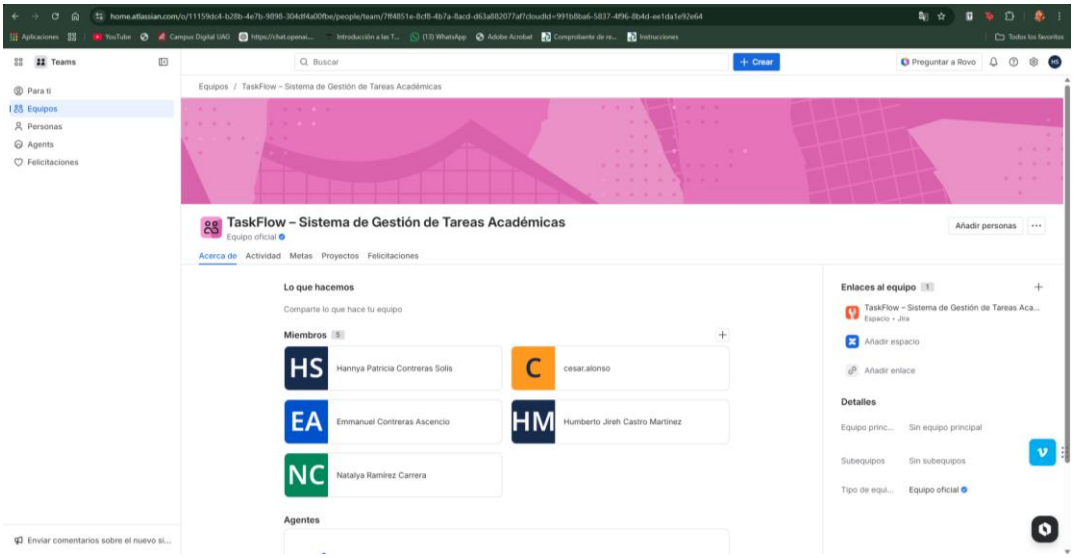

Universidad Autónoma de Guadalajara

Carga de Datos y Planificación del Sprint

Se realizó la carga del Product Backlog integrando las historias de usuario definidas en el Plan de Gestión. Cada historia fue priorizada y estimada utilizando la técnica de Puntos de Historia, asignando valores de complejidad basados en la escala de Fibonacci para reflejar el esfuerzo relativo de desarrollo. Como se observa en la gestión del backlog, las historias cuentan con criterios de aceptación claros y están alineadas a la Definition of Ready (DoR) antes de ser comprometidas al ciclo de trabajo.

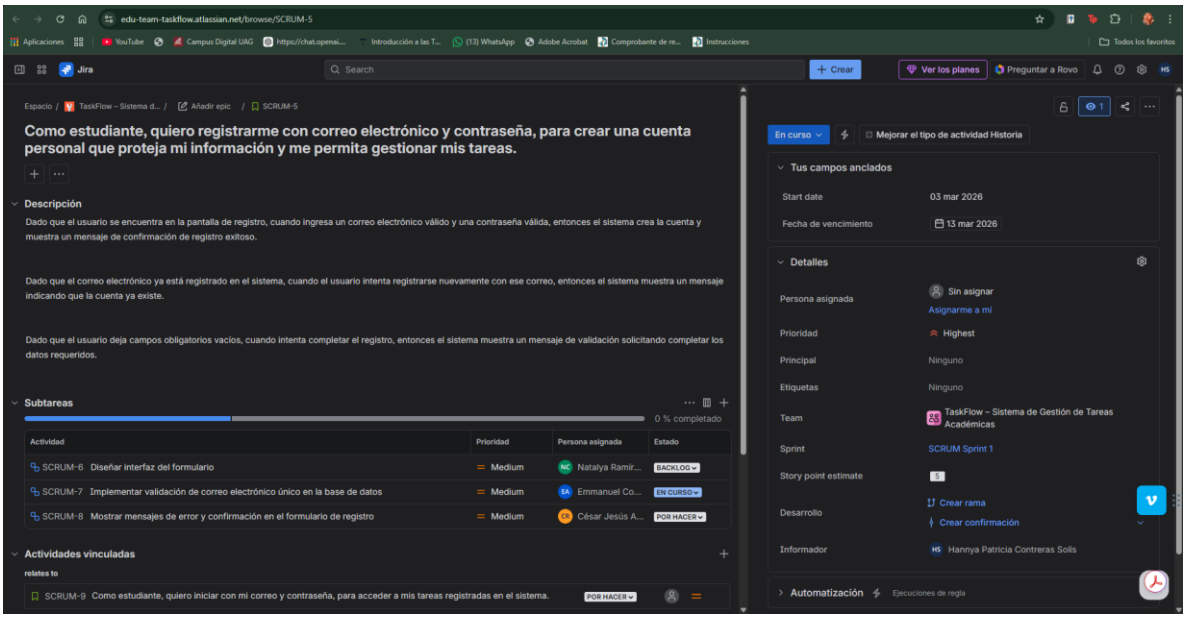

Universidad Autónoma de Guadalajara

Simulación de Inicio de Sprint 1:

Se dio inicio al SCRUM Sprint 1 (Acceso y Base Técnica), el cual comprende el periodo del 03 al 16 de marzo. Para esta iteración, se seleccionaron tres actividades críticas del Lanzamiento 1:

- **Registro de usuario:** Historia con una estimación de 5 puntos debido a la lógica de validación y seguridad requerida.
- **Inicio de sesión:** Estimada en 3 puntos, enfocada en la autenticación segura contra la base de datos.
- **Cierre de sesión:** Configurada con una estimación de 2 puntos para garantizar la destrucción segura de sesiones activas.

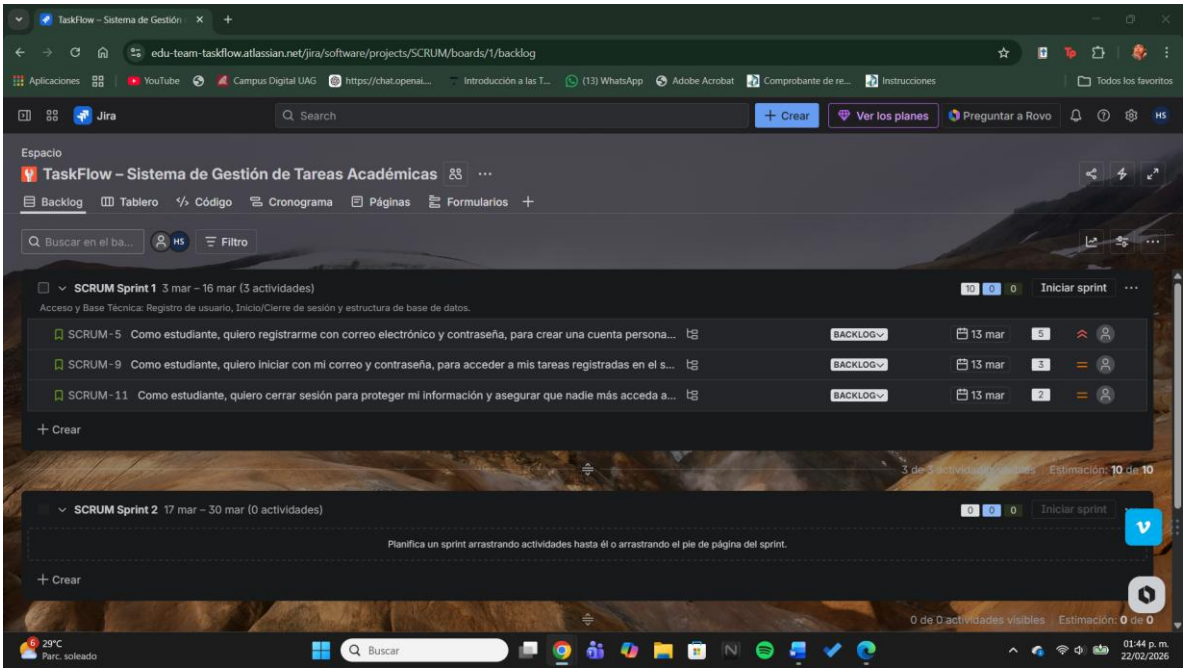

Universidad Autónoma de Guadalajara

Visualización del Tablero y Monitoreo de Historias de Usuario

Esta captura muestra el tablero Scrum en su vista principal, donde se gestiona el progreso de las Historias de Usuario del Sprint 1. Se observa el flujo operativo definido, donde las historias se mueven secuencialmente entre las columnas de PRODUCT BACKLOG, SPRINT BACKLOG y EN PROGRESO*. Actualmente, la historia de registro se encuentra en curso para simular el inicio del desarrollo, mientras que las de inicio y cierre de sesión permanecen en el backlog del sprint listas para ser atendidas. Este tablero permite al equipo y al Stakeholder visualizar de manera inmediata el porcentaje de avance del incremento funcional del sistema TaskFlow.

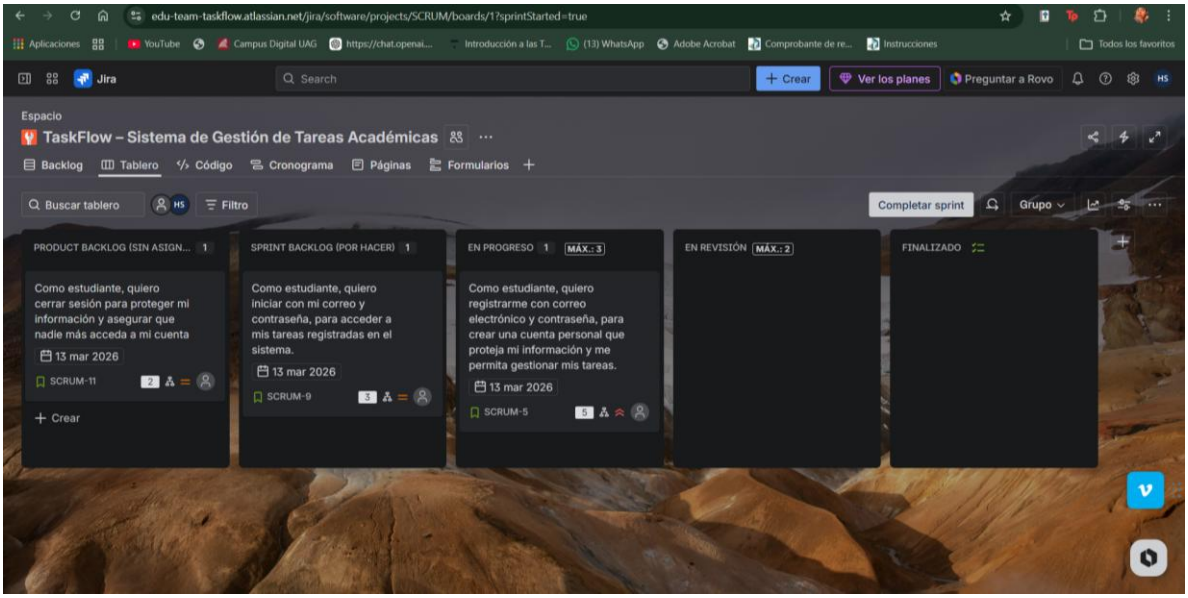

En esta vista detallada del tablero, se evidencia el desglose de las Historias de Usuario en subtareas técnicas, facilitando un monitoreo granular de la ejecución. Cada historia ha sido dividida en actividades específicas como el diseño de la interfaz, validación de datos en el servidor y configuración de la base de datos MySQL, permitiendo asignar responsables específicos a cada componente del sistema.

Esta estructura garantiza que el equipo pueda identificar cuellos de botella técnicos rápidamente durante los Daily Stand-ups. Además, se observa la aplicación de los WIP Limits en acción, asegurando que el equipo se enfoque en terminar el diseño y la validación de los formularios antes de mover nuevas tareas técnicas a la columna de ejecución activa.

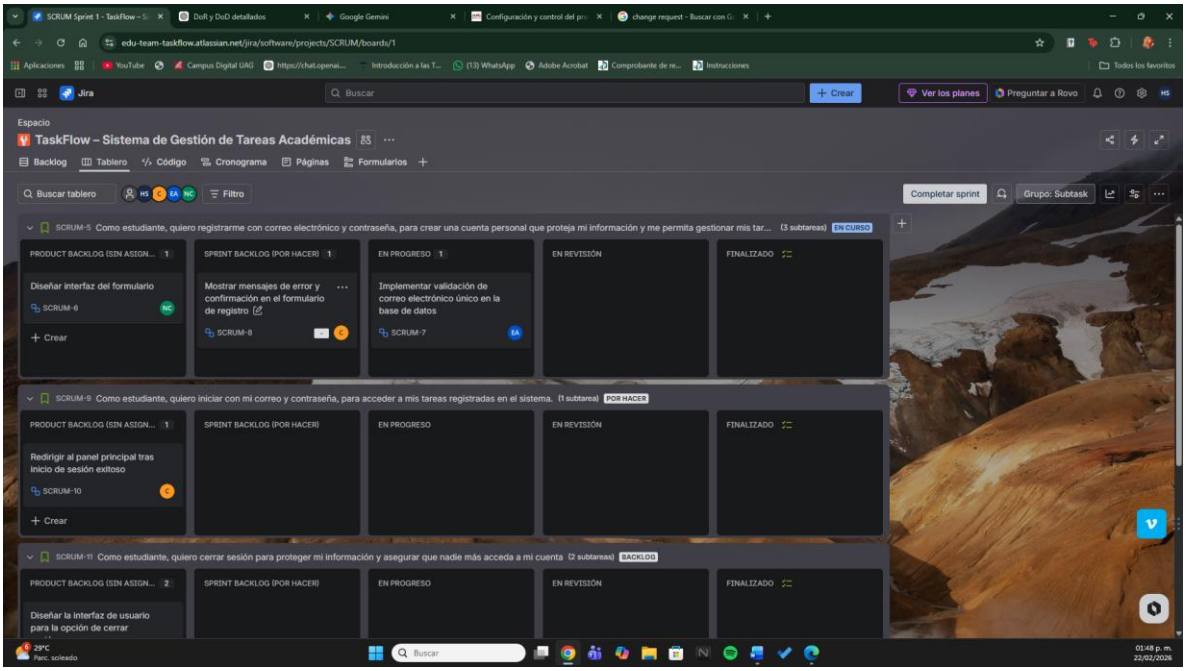

Justificación de la Metodología Seleccionada

Para el desarrollo del proyecto TaskFlow – Sistema de Gestión de Tareas Académicas, el equipo seleccionó un enfoque Ágil bajo el marco de trabajo Scrum con adaptación tipo ScrumBan. Esta decisión se fundamenta en las características propias del proyecto, la naturaleza evolutiva de los requisitos y la necesidad de mantener control continuo durante la ejecución.

TaskFlow es un sistema orientado a la gestión de tareas académicas, cuyo alcance funcional puede evolucionar conforme se identifican mejoras en la experiencia de usuario, ajustes en prioridades o necesidades adicionales del cliente. En este contexto, un enfoque predictivo tradicional no resultaba el más adecuado, ya que establece un alcance rígido desde el inicio y limita la incorporación flexible de cambios durante la ejecución.

La metodología Ágil permite dividir el proyecto en iteraciones cortas denominadas Sprints, dentro de las cuales se desarrollan incrementos funcionales completamente operativos. Este enfoque facilita la entrega progresiva del sistema, permitiendo validar funcionalidades como registro de usuario, autenticación, creación y gestión de tareas antes de avanzar hacia características más complejas como organización por prioridad o mejoras de experiencia de usuario.

Asimismo, la implementación mediante Jira permite estructurar formalmente los artefactos ágiles requeridos: Product Backlog priorizado, historias de usuario estimadas en Story Points, tablero con flujo controlado y generación de métricas como el Burndown Chart para monitorear el avance. Este sistema de seguimiento proporciona visibilidad continua del progreso y permite detectar desviaciones tempranas dentro de cada Sprint.

La adopción de límites de trabajo en progreso (WIP) y la estructura de columnas (To Do, In Progress, Review, Done) favorecen la organización del equipo, evitan la sobrecarga de tareas simultáneas y promueven un flujo constante de entrega. De esta manera, se garantiza disciplina operativa sin perder adaptabilidad.

Desde el punto de vista del equipo, el enfoque Ágil fortalece la colaboración continua, ya que establece reuniones periódicas como Sprint Planning, Daily Stand-Up, Sprint Review y Retrospective. Estas ceremonias permiten coordinar esfuerzos, resolver bloqueos técnicos y mejorar el proceso en cada iteración.

En conclusión, la elección de la metodología Ágil resulta coherente con la naturaleza iterativa del sistema TaskFlow, el entorno académico en el que se desarrolla y la necesidad de mantener control y seguimiento constante del avance. Este enfoque permite combinar flexibilidad ante cambios con mecanismos formales de medición y control, garantizando una ejecución organizada, colaborativa y orientada a resultados funcionales verificables.
