Universidad Autónoma de Guadalajara

MATERIA:

Administración de proyectos de software

DOCENTE:

Mtro. Manuel Balderas Victoria

CARRERA:

Ingeniería en Software Y Minería de Datos

SEMESTRE: 8º

ACTIVIDAD:

Core PM

EQUIPO:

César Jesús Alonso Rodríguez

Emmanuel Contreras Ascencio

Hannya Patricia Contreras Solís

Humberto Jireh Castro Martínez

Natalya Ramírez Carrera

FECHA:

27/03/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara

Gestión de Cambios

En un modelo tradicional (Cascada), cualquier modificación a mitad del proyecto requiere un formato formal de "Solicitud de Cambio" y la aprobación de un comité. En nuestra metodología ágil implementada a través de Jira, esta burocracia se reemplaza por una gestión dinámica y trazable del *Product Backlog. Las evidencias adjuntas demuestran cómo el equipo TaskFlow documenta, estima y asigna un cambio de alcance solicitado por el cliente sin perder el historial del proyecto:

- **Preservación del Alcance Original (Evidencia SCRUM-37):** Como se observa en la primera captura, el requerimiento inicial era la eliminación física de registros ("borrado permanente"). Esta Historia de Usuario original se preserva en el sistema con un estatus de "Finalizado". Podemos auditar que fue debidamente documentada con sus propios Criterios de Aceptación, se le asignó una prioridad Alta y una estimación de 4 Puntos de Historia. Esto demuestra la línea base de lo que se construyó en el Sprint 4.

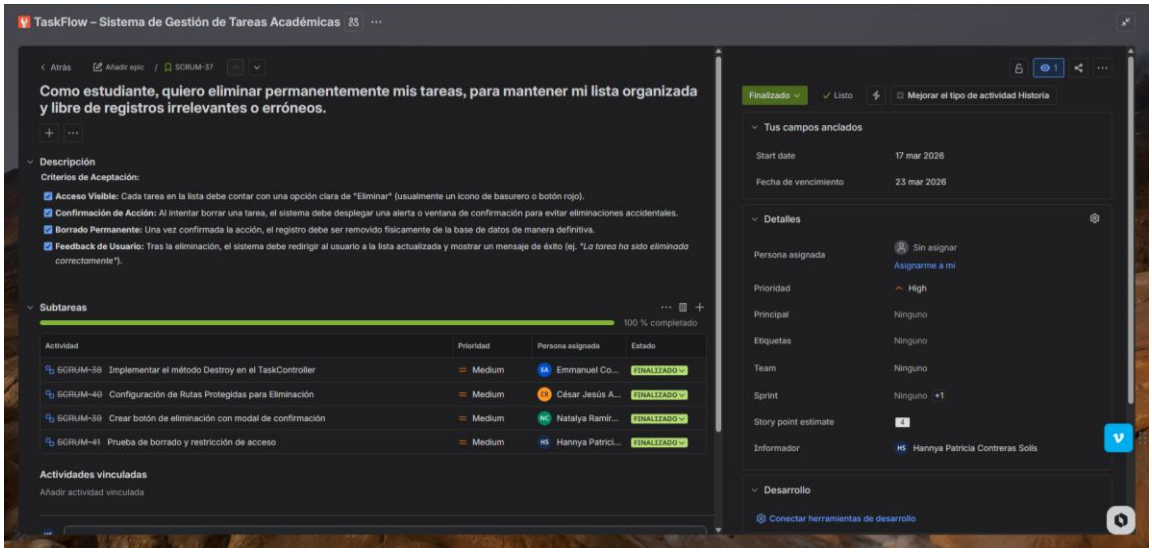

- **Trazabilidad del Nuevo Requerimiento (Evidencia SCRUM-72):** Ante la nueva necesidad de cambiar la eliminación física por una eliminación lógica, el equipo no sobrescribió ni borró el ticket anterior (lo cual destruiría la evidencia histórica). En su lugar, se levantó el ticket SCRUM-72. En la descripción se documenta explícitamente el origen del cambio, esto actúa como nuestra justificación formal del cambio.

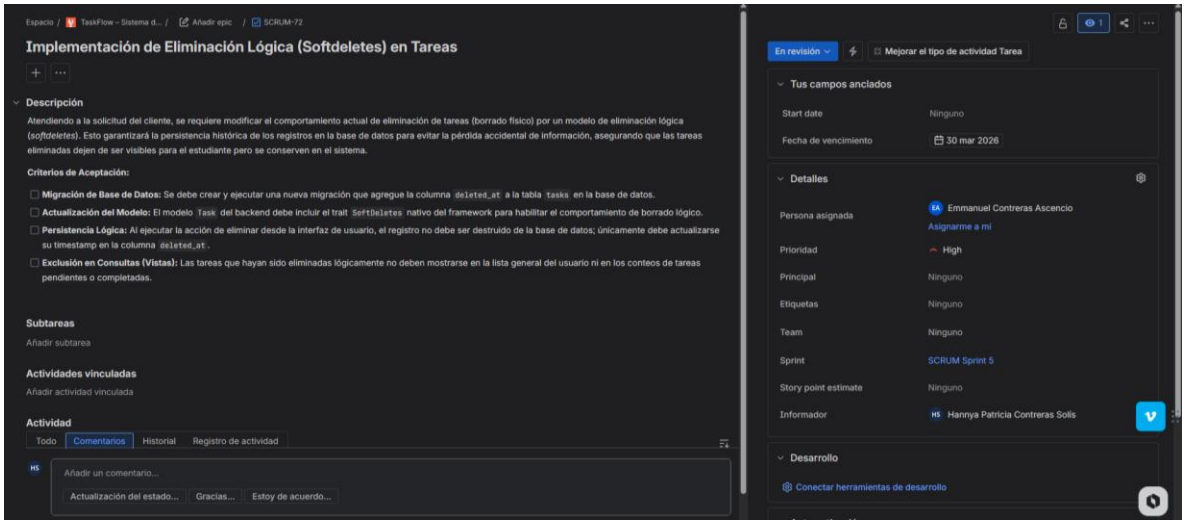

El nuevo ticket (SCRUM-72) demuestra que el cambio fue analizado técnicamente. Se definieron nuevos Criterios de Aceptación específicos para este ajuste, además se evidencia la nueva estimación de impacto: se le asignó una prioridad Alta, se agendó oficialmente para el Sprint 5, se le puso una fecha de vencimiento (30 mar 2026) y se asignó directamente a un responsable para su desarrollo.

La plataforma Jira nos proporciona una bitácora inalterable. El contraste entre SCRUM-37 y SCRUM-72 evidencia quién solicitó el cambio, qué implicaciones técnicas tuvo, en qué iteración se absorbió y quién es el responsable de ejecutarlo, cumpliendo al 100% con los principios de Gestión de Cambios exigidos por la norma, pero con la velocidad de un entorno Ágil.

Acciones Correctivas

En las metodologías tradicionales, resolver un problema de proceso exige levantar un "Reporte de No Conformidad" y documentar un plan de acción correctivo. En nuestro entorno ágil, esta exigencia normativa se cumple de forma natural, colaborativa y con mayor velocidad a través de la Sprint Retrospective y la generación de Elementos de acción. La captura adjunta evidencia la aplicación de este mecanismo ante un problema real y crítico del proyecto:

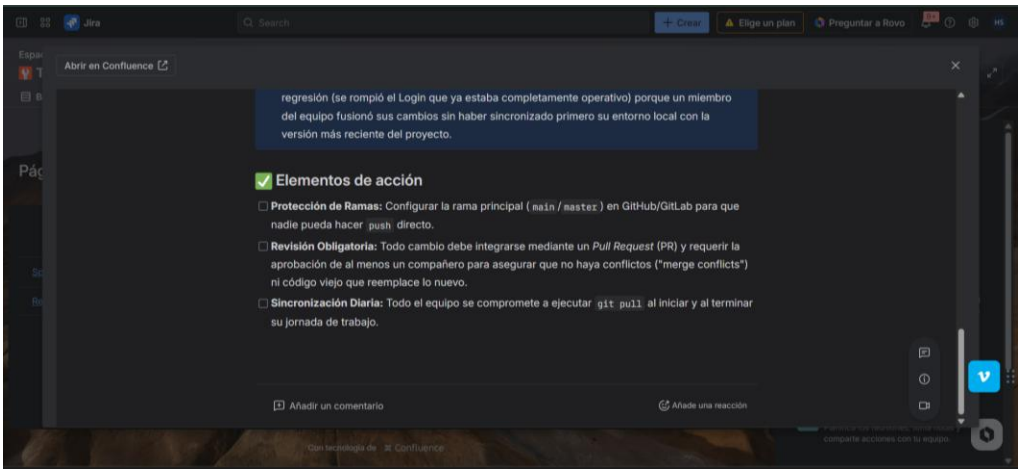

- **Identificación y Documentación del Problema Raíz:** La evidencia muestra que el equipo TaskFlow detectó y registró formalmente una desviación grave: una regresión en el sistema que rompió el módulo de Login (el cual ya estaba operativo). Se identificó claramente que la causa raíz fue un problema de desincronización de código al momento de fusionar el trabajo local con el repositorio principal.

- **Formulación de Acciones Correctivas:** Para asegurar que el problema no se repita en futuros ciclos, el equipo no dejó el tema como una simple advertencia verbal, sino que estableció tres acciones correctivas auditables y de cumplimiento obligatorio:

  1. **Mitigación Técnica (Protección de Ramas):** Bloqueo de subidas directas (push) a la rama principal en GitHub/GitLab.
  2. **Control de Calidad:** Implementación forzosa de Pull Requests, requiriendo la revisión y aprobación de al menos un compañero antes de integrar código, evitando así "merge conflicts" o la sobreescritura con código obsoleto.
  3. **Sincronización Diaria:** El compromiso documentado de ejecutar un git pull al inicio y cierre de cada jornada de trabajo.

Aceptación (Definition of Done)

En los marcos de trabajo tradicionales, la aceptación de una funcionalidad se formaliza mediante la firma de un "Acta de Aceptación" al final del ciclo de vida del desarrollo. En nuestra gestión ágil a través de Jira, esta burocracia se sustituye por un proceso de validación continuo, granular y auditable, regido por el estricto cumplimiento del Definition of Done (DoD) y los Criterios de Aceptación de cada historia.

La captura adjunta (ticket SCRUM-32) demuestra cómo el equipo TaskFlow ejecuta este proceso de aceptación formal:

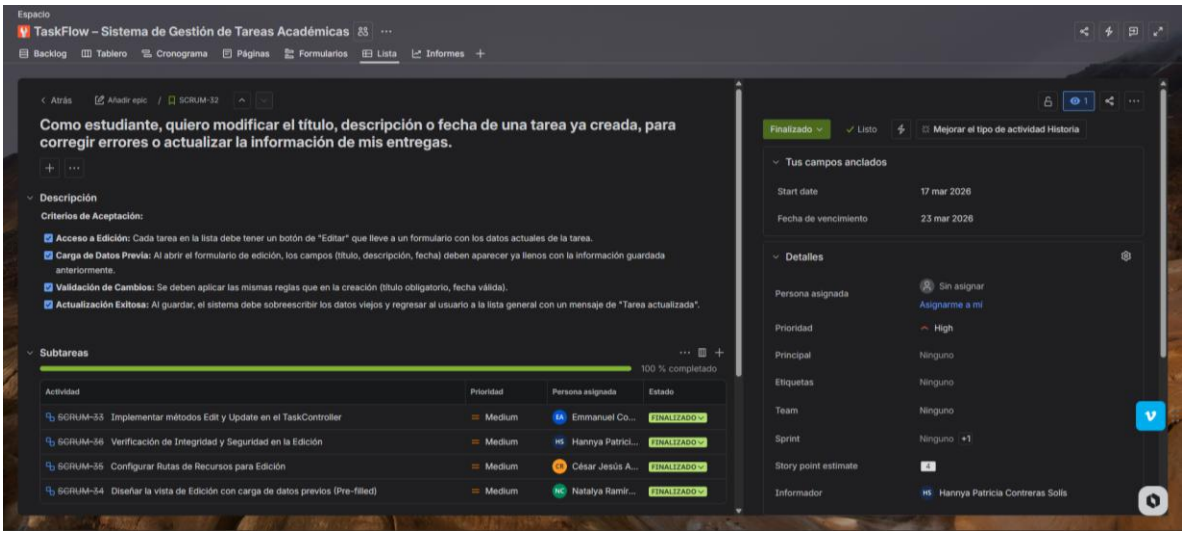

- **Verificación de Criterios de Aceptación:** Se evidencia que la Historia de Usuario para "modificar el título, descripción o fecha de una tarea" no fue movida a terminada de forma arbitraria. Cuenta con cuatro criterios de aceptación obligatorios. Como se observa en la evidencia, todos los puntos fueron validados, comprobados y marcados como completados, asegurando que la entrega cumple exactamente con el valor esperado por el usuario.

- **Completitud Técnica y Trazabilidad de Subtareas:** La aceptación ágil también exige que el trabajo técnico esté concluido. La imagen documenta que la barra de progreso de las subtareas se encuentra al 100% completado. Las cuatro tareas individuales fueron ejecutadas, probadas y llevadas al estado "FINALIZADO", cumpliendo así con los estándares de ingeniería del equipo.

- **Transición Autorizada a Estado "Done":** Únicamente después de haber verificado funcionalmente el checklist de aceptación y técnicamente las subtareas, el equipo autorizó la transición de la Historia de Usuario principal a su estado definitivo de "Finalizado", lográndolo dentro de la fecha de vencimiento estipulada.
